

# 解体工事における周辺環境測定結果


## 空気中の石綿 分析結果

採取・受取日	試料名	分析結果 本/㈬	基準値 本/㈬	合否判定
2012年9月3日 採取	事前調査 周辺環境 東西南北 4ヶ所	0.5未満	10	合
2012年12月17日 採取	第1水処理施設 計量室石綿除去作業中 周辺環境 東西南北 4ヶ所	0.5未満	10	合
2012年12月19日 採取	第1水処理施設 電気室等石綿除去作業中 周辺環境 東西南北 4ヶ所	0.5未満	10	合
2013年1月8日 採取	管理棟施設 3階石綿除去作業中 周辺環境 東西南北 4ヶ所	0.5未満	10	合

## 空気中のダイオキシン類 分析結果

採取・受取日	試料名	測定値 pg-TEQ/m3	基準値 pg-TEQ/m3	合否判定
2012年9月3日 採取	事前調査 周辺環境 東西南北 4ヶ所	0.022 ~ 0.026	0.6	合
2013年10月22日 採取	焼却灰・汚泥中間処理施設 解体中 周辺環境 東西南北 4ヶ所	0.023 ~ 0.025	0.6	合
2013年3月16日 採取	焼却炉施設 解体中 周辺環境 東西南北 4ヶ所	0.019 ~ 0.022	0.6	合

## 測定ヶ所位置図

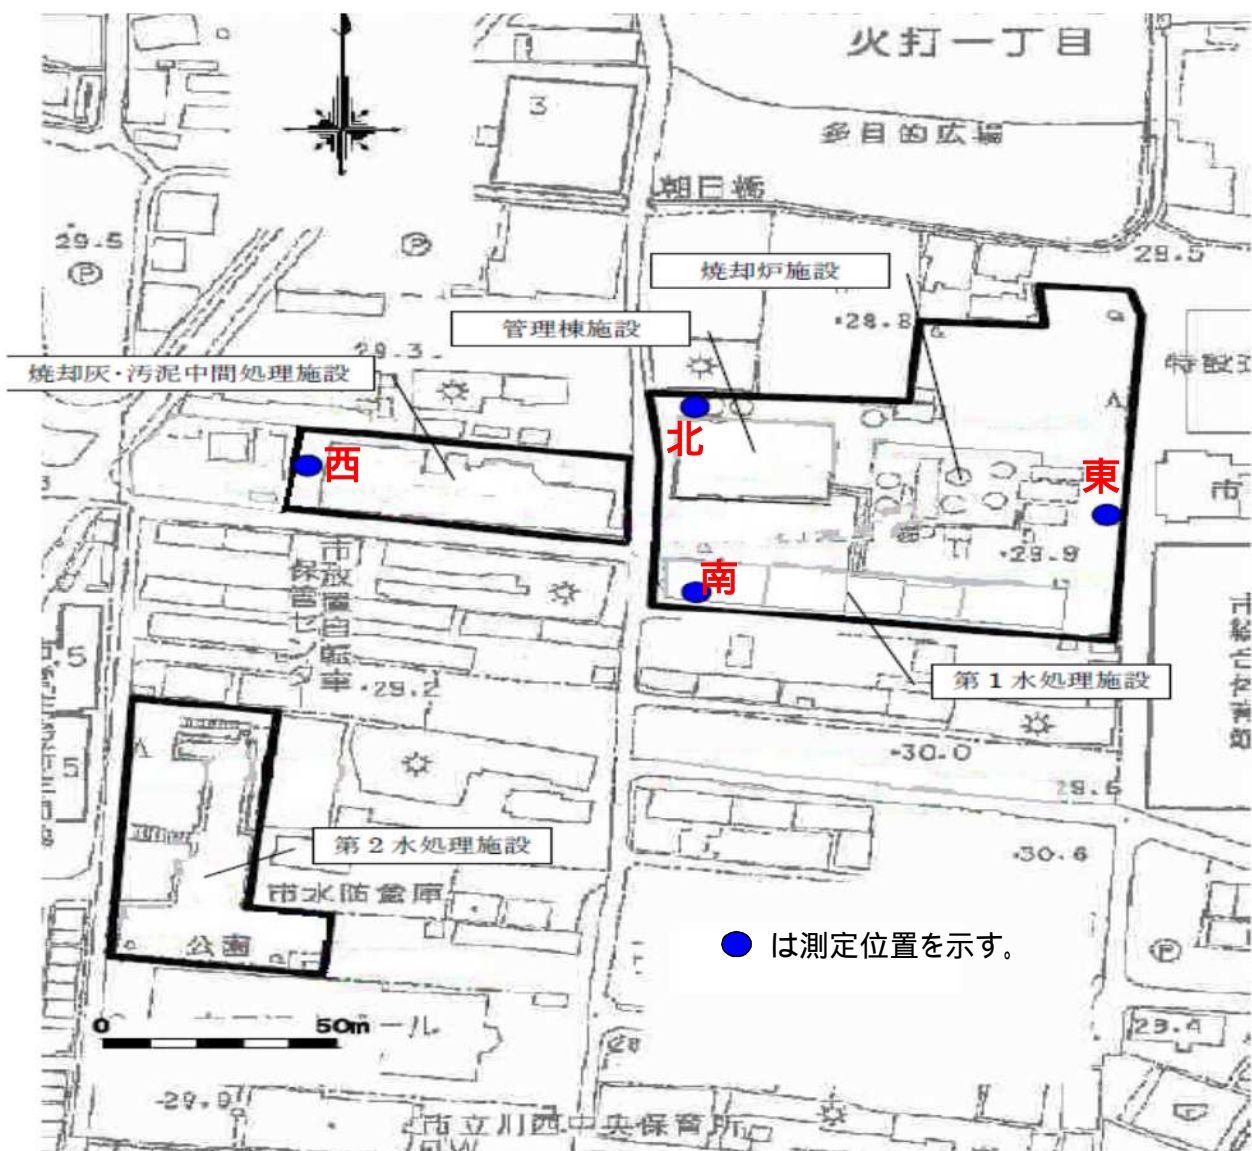

第2水処理施設は、ダイオキシン類及び石綿対策工事がありません。
